

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY



SEMINÁŘ OBK

PŘÍPRAVA NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE


5. 11. 2020

Ing. Petr Závodský

Předseda představenstva a generální ředitel
Elektrárna Dukovany II, a. s.

petr.zavodsky@cez.cz

www.cez.cz/njz

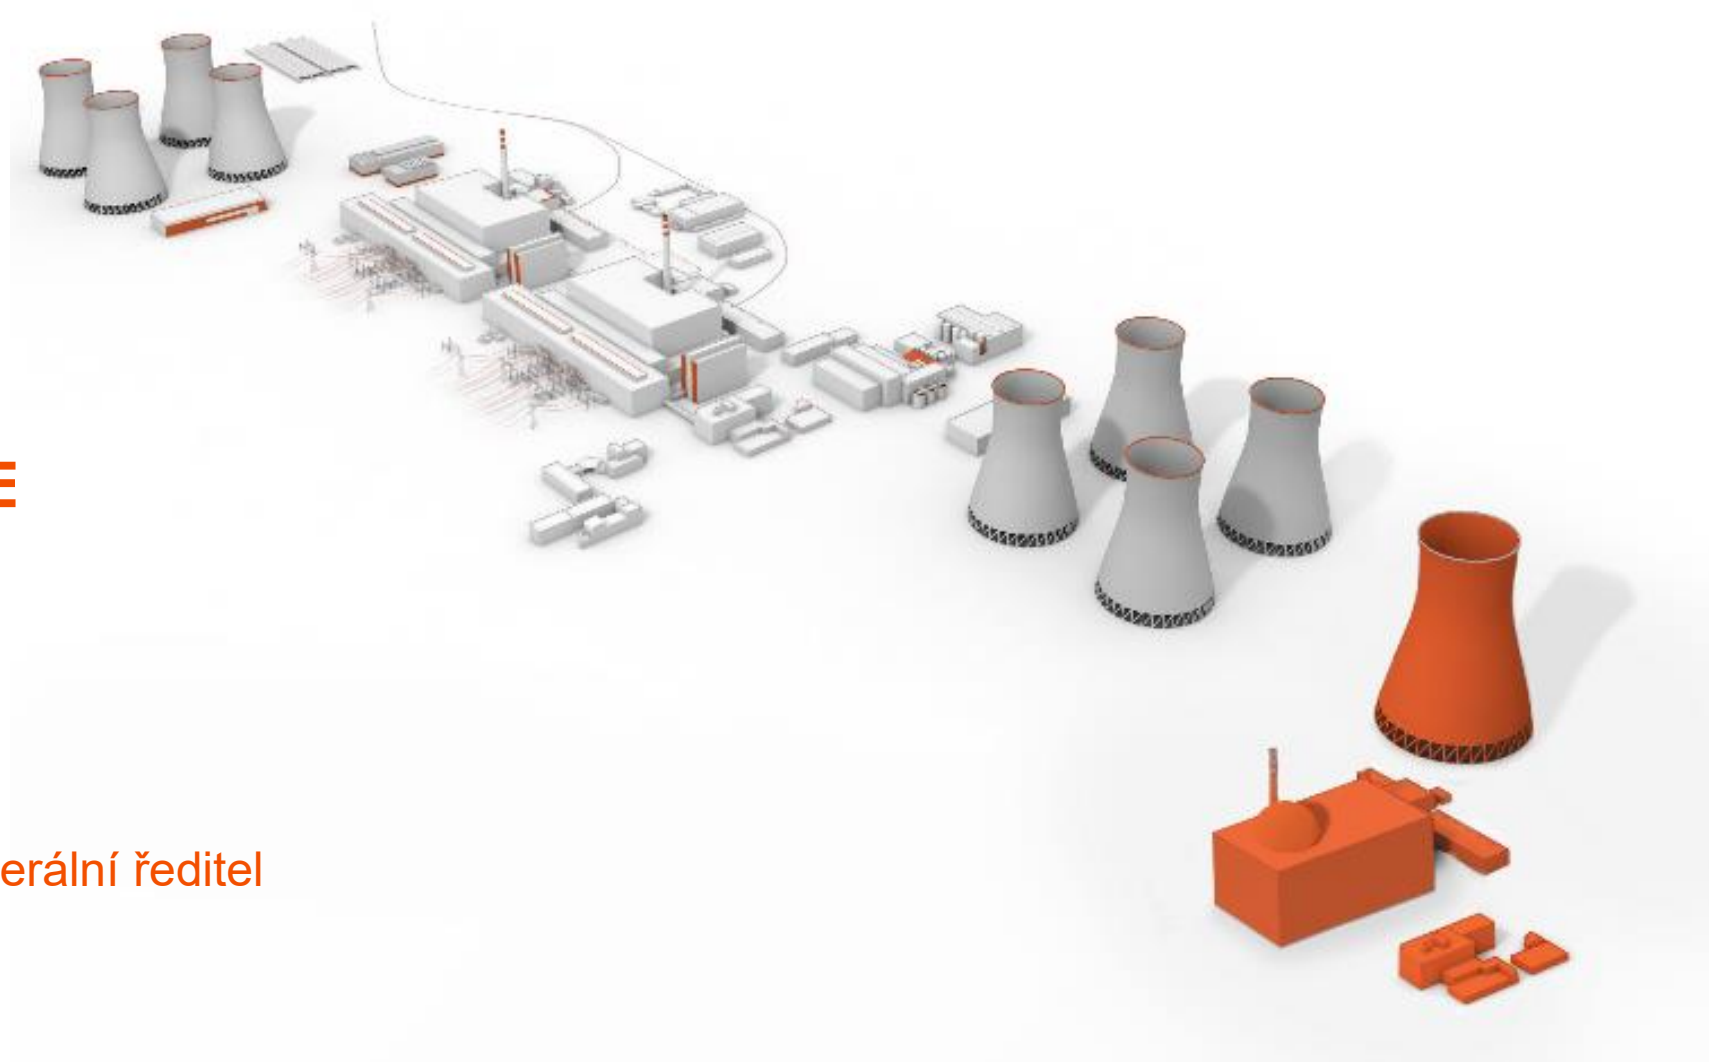



1. Stav přípravy **Výběrového řízení** na dodavatele jednoho bloku Nového jaderného bloku Dukovany a palivových souborů
2. Stav přípravy vydání **Povolení SÚJB k umístění** dvou bloků NJZ Dukovany
3. Stav přípravy vydání **Územního rozhodnutí** pro dva bloky NJZ Dukovany
4. Stav přípravy provádění **Dalších činností** dle přílohy B, PPS

AD. 1 HARMONOGRAM DOKONČENÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ – REALIZOVANÉ ČINNOSTI



- Předání dokumentace k Výběrovému řízení na Stát (včetně zapracování bezpečnostních požadavků) » 29.7. 2020 ✓
- Reakce MPO na zapracování Bezpečnostních požadavků do dokumentace k Výběrovému řízení » 17.9.2020 ✓ (neobsahovala konkrétní požadavky na změnu dokumentace k Výběrovému řízení)
- Odpověď na reakci MPO k zapracování Bezpečnostních požadavků » 25.9.2020 ✓ (prozatím bez reakce)
- Přípomínky Státu k dokumentaci k Výběrovému řízení obdrženy » 30.9.2020 ✓
- Neformální projednání Přípomínek MPO a týmu VZ k dokumentaci k Výběrovému řízení » 15.10.2020 ✓
- Dodatečné Přípomínky MPO k části dokumentace k Výběrovému řízení (AK Havel&Partners) předány EDU » 17.10.2020 ✓
- Předání nové verze dokumentace k Výběrovému řízení na MPO (včetně vypořádání připomínek; vyjma připomínek AK Havel) » 23.10. 2020 ✓

AD.1 HARMONOGRAM DOKONČENÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ – PLÁNOVANÉ ČINNOSTI



- Závěrečná zpráva ÚJV a Arcadis potvrzující kvalitu dokumentace k Výběrovému řízení » 30. 10. 2020 (probíhá finalizace draftu)
- Získání souhlasu státu se zapracováním Bezpečnostních požadavků » 31. 10. 2020 (termín dle PPS)
- Vypořádání připomínek AK Havel » týden od 2. 11. 2020
- Předložení dokumentace k Výběrovému řízení ke schválení orgánům EDU II » týden od 2. 11. 2020
- Posouzení hodnotícího modelu » do 30. 11. 2020
- Předložení dokumentace k Výběrovému řízení ke schválení orgánům ČEZ » na PAS: 16. 11. 2020
» na DR: 26. 11. 2020
- Vypsání výběrového řízení NJZ EDU II » 18. 12. 2020
- Příprava hodnotícího manuálu » nejpozději do 30. 6. 2021
- Termín pro obdržení nabídek uchazečů 31. 7. 2020

AD. 2 POVOLENÍ SÚJB K UMÍSTĚNÍ NJZ EDU



- Dokumentace se skládá (v souladu s přílohou č. 1 část 1. písm. a) AtZ) z následujících dokumentů:
 - *Program systému řízení.*
 - *Zadávací bezpečnostní zpráva.*
 - *Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany.*
 - *Záměr zajištění monitorování výpustí z JZ.*
 - *Program monitorování.*
 - *Záměr zajištění zvládnutí radiační mimořádné události.*
 - *Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu.*
 - *Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby.*
 - *Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení.*
- Proběhlo více než 5 let technických prací na lokalitě EDU pro potřeby NJZ EDU.
- V rámci přípravy dokumentace probíhala spolupráce s mnoha odborníky napříč různými obory (stavaři, technici, klimatologové, hydrologové, hydrogeologové, geotechnici, seismologové, geofyzici atd.).
- Kompletní dokumentace má cca 1600 stran, 17 výkresů a 4 přílohy.

AD. 3 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ K PROJEDNÁNÍ S DOSS – REALIZOVANÉ ČINNOSTI



Stav zpracování DÚR

➤ 10 DÚR zpracováno a odesláno ke stanoviskům:

Dokumentace k vydání Územního rozhodnutí odeslané ke stanoviskům DOSS	Žádosti podány	Vydaných stanovisek
<i>Podzemní kabelové vedení 110 kV z rozvodny Slavětice</i>	09/2020	75 %
<i>Vedení 400 kV vyvedení el. výkonu pro NJZ EDU</i>	09/2020	75 %
<i>Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU</i>	09/2020	65 %
<i>Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE</i>	09/2020	65 %
<i>Odvedení odpadních vod z výstavby do Skryjské nádrže</i>	08/2020	75 %
<i>Odvedení srážkových vod do Skryjské nádrže</i>	08/2020	75 %
<i>Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka</i>	07/2020	80 %
<i>Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka</i>	07/2020	80 %
<i>Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu</i>	08/2020	70 %
<i>Účelová komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU</i>	08/2020	65 %

AD. 3 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ K PROJEDNÁNÍ S DOSS – REALIZOVANÉ ČINNOSTI



- Zbývající 2 DÚR zpracovány a připravovány pro odeslání ke stanoviskům:
 - ✓ DÚR „*Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (včetně zařízení staveniště)*“ je dokončena; probíhají vícetisky a výroba CD k žádostem;
 - ✓ DÚR „*Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence*“ je dokončena probíhá finalizace;

AD.4 STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ PRÁV K NEMOVITOSTEM




- Plocha pro EDU5 vykoupena.
- Pro EDU6 chybí část plochy, nebudeme vyvlastňovat, nepokračujeme stavebním řízením.
- Dostatek ploch pro zařízení staveniště a deponii zeminy – viz. Plán organizace výstavby.
- Zajištěny pozemky LČR na trasách odpadních řadů a řadů surové vody NJZ.
- Je třeba dokončit směnu pozemků s SPÚ a zajistit práva k pozemkům liniových staveb (vyvedení výkonu apod.) fyzických osob – předpokládáme vyvlastňovací proces a dále právnických osob.

- Žádost o autorizaci NJZ

- SaVI:

- Archiv
- Zázemí investora
- Monitoring podzemních vod
- komunikace k NJZ
- trasa NTK

- Zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice

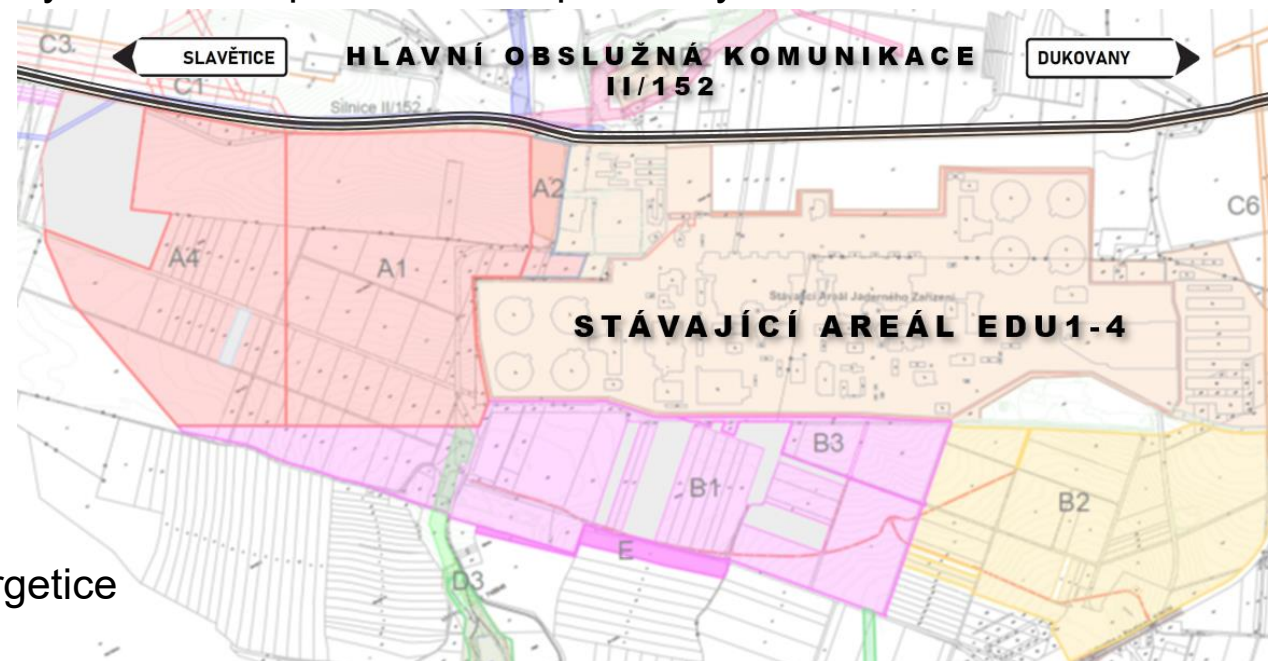

PLNĚNÍ HARMONOGRAMU



Činnost dle 1.1	Milníky	Termín dokončení	EDU II (Ano/Ne)
b)	Podání žádosti o Povolení SÚJB k umístění	Nastalo před uzavřením Smlouvy	Ano
a)	Stát sdělí společnosti EDU II identifikaci základních bezpečnostních zájmů a vyjádří jednoznačně vůli k jejich ochraně.	Nastalo před uzavřením Smlouvy	Ne
a)	Předložení návrhu dokumentace k Výběrovému řízení Státu	3 dny po uzavření Smlouvy	Ano
a)	Připomínky Státu k dokumentaci k Výběrovému řízení	1.9.2020 nebo 2 měsíce po předání dokumentace k Výběrovému řízení Státu podle toho, co nastane později	Ne
c)	Platnost změn územně plánovací dokumentace nezbytných k realizaci Projektu Dukovany	30.9.2020	Ne
a)	Souhlas Státu se zapracováním Bezpečnostních požadavků do dokumentace k Výběrovému řízení	31.10.2020 nebo 2 měsíce po předání návrhu dokumentace k Výběrovému řízení se zapracovanými Bezpečnostními požadavky podle toho, co nastane později	Ne
c)	Podání žádostí dotčeným orgánům či osobám (dále jen „DOSS“) o jejich závazné stanovisko, stanovisko, rozhodnutí či vyjádření pro účely územního řízení	31.1.2021	Ano
b)	Pravomocné Povolení SÚJB k umístění	30.3.2021	Ne
e)	Podání žádosti o Autorizaci	1.5.2021	Ano
c)	Vydání Stanovisek DOSS (v právní moci u těch Stanovisek DOSS, která mají formu rozhodnutí)	15.5.2021	Ne
e)	Pravomocná Autorizace	1.6.2021	Ne
c)	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	1.6.2021	Ano

DĚKUJI ZA POZORNOST

